

MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2020

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W 22 september 2020
Verzonden aan raad 25 september 2020
In commissie n.v.t.
In raadsvergadering 7 oktober 2020

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren				X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen	X	X	X	X

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 oktober 2020

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De Tweede Kamer heeft op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. In september zal de wet in de Eerste Kamer worden besproken. In het wetsvoorstel is bepaald dat bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regels zullen worden gesteld. Deze worden in het najaar 2020 bekend gemaakt.

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De ondersteuning vanuit de Participatiewet is na de corona-lockdown weer opgestart (met inachtneming van de RIVM adviezen).</p> <p>Met het memo Sturingsmogelijkheden budgetten Participatiewet, B-1.10, 07-10-20 Daarom informeren wij de raad over de stand van zaken rondom gemeentelijke uitgaven voor bijstandsuitkeringen en ondersteuning bij re-integratie. Ook schetsen we enkele sturingsmogelijkheden om de kosten van re-integratie te beperken binnen het bestaande budget. Dit memo is geagendeerd voor de commissie van oktober.</p>

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Groepsgewijze activiteiten zijn na de corona-lockdown weer opgestart (met inachtneming van de RIVM-adviezen). De aanzuigende werking als gevolg van de landelijk opgelegde lage inkomensafhankelijke Wmo-eigen bijdrage zet door bij huishoudelijke ondersteuning.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Sportieve en culturele activiteiten en instellingen zijn inmiddels weer herstart of heropend.</p> <p>Het lokaal sport- en beweegakkoord is tot stand gekomen, B1-2, 07-10-20.</p> <p>Het convenant cultuureducatie voor basisscholen is tot stand gekomen, B-3.10, 08-07-10.</p>

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Positief opgroeien en opvoeden



132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Transformatie Specialistische Jeugdhulp



De 2e Rapportage Werkprogramma Jeugd 2019-2021 is t/k naar de raad, B-1.12, 17-06-20 en wordt besproken in de commissie van oktober.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.715	- 8.708	-	-	- 8.708	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.563			- 2.563	
112 Reïntegratie	- 1.411	- 1.411			- 1.411	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 4.735			- 4.735	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.441	- 6.473	-	-	- 6.473	
121 Sportstimulering	- 270	- 270			- 270	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.569			- 1.569	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.634			- 4.634	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 34.178	- 34.178	-	-	- 34.178	
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 2.428			- 2.428	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.750			- 31.750	
Totaal	- 49.334	- 49.359	-	-	- 49.359	

Indicatoren


Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	95	151		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	50	56		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	5	12		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	988	1.018		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	137	218		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	36	35		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	1		maand


	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	1.673	1.806				maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>							
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	565	561	Waarvan 64 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015			maand
		<i>Wmo</i>							
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	267	442				maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	33	48				
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	35	37				maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	0	0				maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	2.436	2.489	**			maand

*afgerond (hele getallen)

** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal (week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:



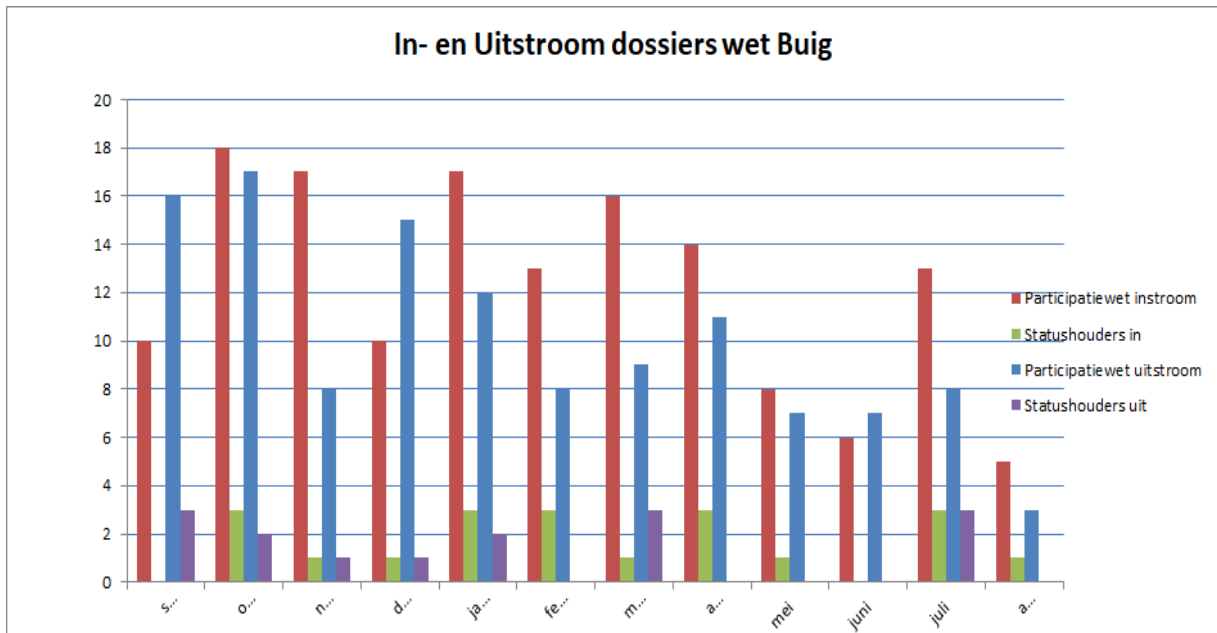

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
123. Actieplan tegen alcohol in het verkeer: jaarlijkse monitoring (892)	08-07-20	08-07-20	Jaarlijkse monitoring van het actieplan komt t/k naar de raad in juli. Deze tussenevaluatie heeft enige vertraging opgelopen en komt t/k naar de raad in september.
123. Memo Kinderombudsman (1007)	n.v.t.	08-07-20	Brief A-3 (Kinderombudsman), 05-02-20 wordt nog niet geagendeerd. Het college is gevraagd de raad hierover een memo te sturen, die in een volgende commissie kan worden geagendeerd. Brief A-8 (jeugdzorg, raad 5 febr) en B-1.8, 18-03-20 (leerplichtverslag) kunnen hierbij worden betrokken. Dit memo verschijnt in oktober.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	113	1009	Vluchtelingen Lesbos	22-04-20	27-05-20	Zie memo Afhandeling motie Vluchtkinderen Lesbos, B-1.14, 27-05-20.
T	132	659	Gevraagd is naar inzicht in het percentage/aantal hermeldingen. Toegezegd is deze vraag aan Veilig Thuis voor te leggen.	30-10-18	12-12-19	De manager van Veilig Thuis heeft hier in de commissie Samenleving van 24-06-20 nadere toelichting op gegeven.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 07-10-20](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Dorpspromotie (en evenementenstimulering)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ondanks corona is in augustus in Barneveld een aantal evenementen in aangepaste vorm georganiseerd. Een aantal van deze evenementen heeft hiervoor een stimuleringssubsidie van de gemeente ontvangen. Het dorpspromotiebeleid is geagendeerd voor november (was oktober) 2020. Zie wijziging planning onderwerpen LTA.

Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ondanks de corona-beperkingen heeft de recreatiesector in Barneveld een goede bezetting gekend tijdens het hoogseizoen. Go Barneveld heeft via haar youtube-kanaal een serie korte filmpjes gepresenteerd waarin de mogelijkheden van het toeristisch recreatief product van Barneveld tijdens corona-tijd in beeld worden gebracht.

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B					In de maandrapportage van februari is reeds gemeld dat de planning voor Harselaar Zuid uiterst onzeker is, vanwege de stikstofproblematiek. Het bestemmingsplan is inmiddels vooralsnog geagendeerd voor februari 2021 i.p.v. december 2020.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid					<p>De overdekte rijwielstalling bij Harselaar/Barneveld-noord voor e-bikes, buitenmodell fietsen, scooterklampen met laadpunten en camerabewaking op begane grond van het Transferium is nagenoeg gereed.</p> <p>Uitbreiding fietsstalling Barneveld centrum en buurtbushaltes met voetgangersoversteken op Postweg in de Glind zijn in overleg met het wijkplatform voorbereid en gereed voor uitvoering.</p> <p>Voorstellen met betrekking tot het doorgaande verkeer door Garderen en het doorgaande verkeer door Terschuur zijn gemaakt. De raad is hierover geïnformeerd, verkeeronderzoek Garderen, B-2.11, 08-07-20 en verkeeronderzoek Hoevelakenseweg, B-2.8, 07-10-20.</p> <p>Voor een veilige inrichting van het kruispunt Hoevelakenseweg/Eendrachtstraat in Terschuur wordt een schetsontwerp opgesteld in samenwerking met bewoners/Plaatselijk Belang TerBroek. Ten behoeve van het onderhoud aan de Apeldoornsestraat worden de voorbereidingen gestart (onderdeel Samenwerkingsovereenkomst).</p> <p>Verkeersmaatregelen aan de Molenweg in Voorthuizen zijn gerealiseerd. Het verkeersgedrag zal worden gemonitord. In het kader van het GVVP zijn de 30 km-inrichting aan de Rehobothstraat en de extra parkeervoorzieningen aan de Kosterijweg gerealiseerd.</p> <p>In het kader van 'Duurzame Mobiliteit' wordt een plan uitgewerkt voor de uitbreiding van de Laadinfra.</p> <p>Eind dit jaar start uitvoering van de verbeteringen Vellerselaan en de 30 km zone de Wildzoom/Jachtlaan.</p>

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



Samen met de Ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang Garderen is een proef gestart met een parkeerverwijssysteem in combinatie met een blauwe zone op het Koepelterrein. In het najaar volgt onderzoek naar eventuele aanvullende maatregelen om het doorgaande (vracht)verkeer te ontmoedigen door de kern te rijden.

Voor de MIRT A1-A30 zijn alle onderzoeken afgerond, besproken en wordt in samenspraak met RWS, Ministerie, Provincie en FoodValley geanalyseerd hoe de 6 kansrijke oplossingen scoren en of er een voorlopig voorkeursalternatief is. Direct belanghebbenden zijn ook geïnformeerd door 1-op-1 gesprekken. Begin september is de geplande inloopbijeenkomst vervangen door een presentatie met voice-over, die is geplaatst op de projectenwebsite en ook is de nieuwsbrief verspreid.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 1.445	- 1.427	-	-	- 1.427	
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.427			- 1.427	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 102	- 102	-	-	- 102	
221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102			- 102	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.603	- 2.483	- 64	-	- 2.547	
231 Verkeer	- 3.052	- 2.985	- 64		- 3.049	Verwijderen plateaus Stationsweg
232 Parkeren	449	501			501	
Totaal	- 4.149	- 4.012	- 64	-	- 4.076	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,8 %	1,7%	<i>Totaal aantal WW'ers in augustus 2020: 521 = 1,7% Landelijk 3,1, Foodvalley 2,2%</i>	maand
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	2.316	2.626	Verkoop 3 percelen bouwterrein Harselaar West West	kwartaal
222	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211 Breedband Buitengebied (404)	05-02-20	07-10-20	Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten komt een voorstel naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit was geagendeerd voor oktober. Dit wordt december. Op dit moment bezien we of en hoe we mogelijk geld dat nog beschikbaar is in kunnen zetten voor de verglazing van de kernen in het buitengebied. Hierover zijn we ook in gesprek met commerciële partijen. Verwachting is dat we hier in Q4 duidelijkheid over hebben waarna er een voorstel naar de raad komt.
211. Dorpspromotiebeleid (766)	27-05-20	07-10-20	Het dorpspromotiebeleid was geagendeerd voor oktober 2020. Dit wordt november. Er is een inventarisatieronde geweest langs de verschillende verenigingen van plaatselijk belang om te inventariseren welke kansen zij zien om te participeren in een gemeenschappelijke dorpspromotie. Als gevolg van de corona-uitbraak is dit nog niet uit gewerkt in beleid. De planning is om dit na het zomerreces op te plakken.
221. PDV / GDV-beleid regio Foodvalley (754)	18-03-20	07-10-20	Het PDV/GDV beleid was voor wensen en bedenkingen geagendeerd voor oktober. Dit wordt november. Het PDV-beleid is in concept gereed. In de regio vindt nu besluitvorming plaats*. Daarna kan het pas in procedure richting raad worden gebracht. <i>*Het PDV/GDV beleid is in september door het AB van de regio vastgesteld.</i>
231. Voorstel onderzoek westelijke rondweg Barneveld (932)	27-05-20	08-07-20	Het was de bedoeling om de raad in juni door middel van een brief te informeren over de nut en noodzaak van de westelijke rondweg en over het vervolg. Dit is gewijzigd. Het college stelt voor dit onderwerp vertrouwelijk met de raad te bespreken.
231. Afwegingskader openbare (particuliere) wegen (727)	18-03-20	08-07-20	Er moet inzicht komen in de omvang, het gebruik en de toestand van de particuliere wegen en de noodzaak om al deze wegen al dan niet openbaar te maken/houden. Er wordt een afwegingskader opgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten hieraan zijn verbonden. Een voorstel hiervoor zou naar verwachting in oktober aan de raad worden voorgelegd. Dit wordt eind 2020/begin 2021.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
222. Bestemmingsplan Harselaar-Zuid (29)	18-03-20	09-12-20	Was nog geagendeerd voor december 2020. Vooralsnog uitgaan van februari 2021, i.v.m. het zoeken van een oplossing voor de stikstofproblematiek.

231. Snelfietsroute Holzenbosch - Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding (Voorthuizen) (599)	11-11-20	11-11-20	Voorstel voor scenario's was geagendeerd voor november. In september komt er een procesmemo t/k naar de raad. Daaruit blijkt de nieuwe planning.
---	----------	----------	--

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/TBp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking	
M	232	796	Dit jaar nog met een digitaal systeem te gaan werken, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken met het barcode dagvergunningssysteem in Amersfoort.	07-06-17	13-12-17	In overleg met o.a. de BMV is voor een oplossing gekozen met gebruiksgemak voor ondernemers en bedrijven. Hiermee wordt het papieren kaartje – van de publieksbalie- vervangen door een 24/7- digi/kaartloze parkeeronthefing. De opdracht is verstrekt. De zuilen worden naar verwachting binnenkort geplaatst en dan gaat de proef, van een jaar, van start.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 07-10-20](#)

Grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding	bedragen x € 1.000
Bedrijventerrein											
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.180	4,26 ha		- 314	- 265	49	314		2023	
800008 - Briellaerd Noord	3	1.218	-	0,04 ha	- 883	- 883	-	883		2020	
800020 - Harselaar Centraal	3	14.749	0,22 ha		- 14.632	- 14.632		14.632		2020	
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 594	2,60 ha	0,03 ha	3.686	3.308	- 378			2021	
800031 - Harselaar West West	3	- 354	0,03 ha	0,03 ha	3	3	-			2020	
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.248	0,83 ha		- 859	- 883	- 24	859		2026	
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.552	0,77 ha	0,11 ha	- 717	- 739	- 22	717		2023	
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.458	8,80 ha		6.904	6.822	- 82			2029	
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		30.457	17,51 ha		- 6.812	- 7.269	- 457	17.405			

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

800029 - Harselaar Zuid fase 1a: Kosten(raming) bovenwijkse voorzieningen verhoogd, waardoor de bijdrage vanuit deze locatie hoger wordt en het resultaat afneemt.

800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2: Kosten(raming) bovenwijkse voorzieningen verhoogd, waardoor de bijdrage vanuit deze locatie hoger wordt en het resultaat afneemt.

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Opstellen Woonvisie 2021-2025					In de maandrapportage van mei is gemeld dat de Woonvisie in maart 2021 wordt vastgesteld en dat de raad over de aangepaste planning wordt geïnformeerd. Het plan van aanpak voor de op te stellen woonvisie is t/k naar de raad, B-3.16, 08-07-20.

312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2					De civieltechnische werkzaamheden voor Woudse Erven I nemen meer tijd in beslag. Dit betekent dat het ontwerp bestemmingsplan later in procedure gaat. Het bestemmingsplan is nu geagendeerd voor december. Zie 'wijziging planning onderwerpen LTA'. Het bestemmingsplan Burgthoven fase III is inmiddels onherroepelijk. Met een ontwikkelaar in de Burgt zijn nieuwe afspraken gemaakt. De intentieovereenkomst is voor wensen en bedingen aan de raad aangeboden.

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het woonrijpmaken ligt op schema. Inrichting van de speelplekken start in oktober.
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het bestemmingsplan is vastgesteld. Inmiddels zijn er 2 beroepen tegen het plan bij de Raad van State ingediend. Het grondwerk voor het verkeersplateau is aanbesteed. In oktober zal gestart worden met de werkzaamheden.

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het ontwerp bestemmingsplan Oostbroek is in voorbereiding, naar verwachting ter inzage in oktober. Vooralsnog geagendeerd voor november (i.p.v. oktober). Zie wijziging planning onderwerpen LTA.

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het aantal inbraken is gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2019 waren er tot deze maand 67 inbraken gepleegd, in 2020 tot deze maand 44 inbraken. Het is een landelijk beeld dat er een enorme daling van het aantal woninginbraken is. Door de corona crisis zijn mensen veel thuis geweest. De laatste maand merken we weer een lichte stijging.

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het aantal overlast meldingen is gestegen tijdens de corona crisis. Mensen zijn meer thuis en ervaren meer overlast. Deze overlast situaties hebben we de afgelopen maanden goed op kunnen pakken, samen met de verschillende ketenpartners. Door middel van het voeren van gesprekken tussen de verschillende partijen en, als het echt nodig is, het gebruiken van juridische mogelijkheden. In augustus is bijvoorbeeld nog een gebiedsverbod uitgereikt.

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De afgelopen maanden is op het gebied van ondermijning vanuit de gemeente nauwelijks geacteerd. Door de corona crisis ontbrak de tijd en konden een aantal preventieactiviteiten gewoonweg niet doorgaan, zoals een bijeenkomst met notarissen, een bijeenkomst aanpak hennep en een integrale controle. Deze activiteiten zijn verschoven naar het najaar 2020. Op 7 juli 2020 zijn we weer gestart met een integrale controle.
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Op 1 juni is de pilot verruiming terrastijden gestart. De afgelopen maanden hebben we de horeca begeleid met de uitbreiding van de terrassen in verband met de corona crisis.

Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen zijn de afgelopen maanden afgenomen. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten. Er is daarom in juli een voorlichtingscampagne geweest op social media, waar politie en wij als gemeente aan mee hebben gewerkt. De afgelopen maanden zijn we gestart met het project cyber 24 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit project heeft als doel om bewustwording te creëren bij jongeren van wat online gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag voor henzelf en voor hun slachtoffer(s), in de vorm van een eigentijds en interactief spel op de scholen.

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Uitbreiding begraafplaats De Plantage



Begin september is aannemer Dusseldorp ISM BV gestart met het 'gebruiksrijp' maken van het uitbreidingsdeel.

De werkzaamheden zijn onder andere het aanleggen van het groen, het asfalt, het hekwerk en de realisatie van de waterpartij en de zitelementen. Ook zorgt de aannemer voor de aanpassingen voor het oversteken bij de bestaande begraafplaats. Daarnaast worden er tijdens het asfalttransport verkeersregelaars ingezet, om de benodigde verkeersmaatregelen op de Oldenbarnevelderweg te begeleiden.

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid



325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte



De Manifestregio Vallei en Veluwe heeft een definitieve versie van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) en een concept Werkplan manifest 2021-2022 opgesteld. Het RAP wordt na het zomerreces ter besluitvorming aan het college voorgelegd en ter kennisname naar de raad gebracht.
In oktober organiseert de regio een webinar voor bestuurders. Het Werkplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De ondertekening van het RAP en het Werkplan in de Manifestregio is voorzien in december 2020 bij de regionale Klimaatop. Er wordt een structurele jaarlijkse bijdrage gevraagd van ca. € 3.000. Dit kan uit het GRP worden gedekt.

Er is een vacature Projectleider groene schoolpleinen opengesteld om aan dit onderwerp een stevige impuls te geven. Deze functionaris wordt met name belast met de ontwikkeling van natuurlijke, groene schoolpleinen in nauwe samenwerking met de schoolbesturen en de gebruikers. Daarnaast verricht de functionaris andere werkzaamheden op het gebied van klimaatadaptatie.

De Subsidieregeling regenwater vasthouden gemeente Barneveld is vastgesteld en ter kennisname naar de raad, B-3.9, 07-10-20. Deze nieuwe regeling is ingegaan per 31 juli jl.. Hierover is intern (nieuwsbrief) en extern (persbericht, gemeentelijke website) gecommuniceerd. Aanvullende communicatieberichten volgen om meer bekendheid te geven aan de nieuwe regeling.

Waterbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 – 2026: De bestuurlijke workshop met de commissie heeft plaatsgevonden op 29 juni jl. De bijbehorende presentatie is met de commissie en de projectgroep gedeeld. De kaderstellende notitie wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad (november). In november/december 2020 gaat het concept GRP ter informatie naar de raadscommissie waarna deze ter inzage wordt gelegd. Vaststelling is voorzien in februari 2021.</p> <p>Verbeterplan riolering De Glind: De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Er zijn nog een paar afwerkpunten, zoals het buiten gebruik stellen van de oude riolering en groenvoorzieningen. Door onvoorziene zaken, waaronder meerdere grote bodemverontreinigingen, extra kosten in het kader van de PFAS en de aanneme bij aanvang project over de ligging van leidingen, die flink afweek van de werkelijkheid, is een forse overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet ontstaan. Eerder dit jaar is hiervoor dekking gevonden. Ook vindt overleg plaats met de Rudolpstichting over een extra financiële bijdrage.</p>
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Energievisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Regionale Energie Strategie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Regionale Energie Strategie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De concept-Regionale Energie Strategie (RES) is geagendeerd voor 23 september 2020. Daarvoor is ook een extra commissievergadering gepland.

Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Windvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De commissie MER heeft op 30 april 2020 advies uitgebracht over de MER windenergie Barneveld. Het college heeft op 9 juni besloten om het MER aan te vullen conform het advies van de commissie MER. Inmiddels is de aanvulling van de MER beschikbaar, evenals de resultaten van de zogenaamde 'beleidsconfrontatie'. Deze informatie is geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 23 september met daaraan voorafgaand bespreking in een (extra) commissievergadering.
-----------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In de maandrapportage van mei is reeds gemeld dat het Beleidsplan Biodiversiteit in juni 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden i.p.v. februari 2021. Dit is nu bij de 'wijziging planning onderwerpen' opgenomen.

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gewerkt wordt aan een Ambitiedocument (of Koersdocument) waarin wordt bepaald wat de "manier van werken" wordt van Barneveld met de Omgevingswet. Daarin wordt de voorbereiding van de afgelopen periode samengebracht en worden daarover besluiten genomen. Onderdeel van dit document is een actualisering van het projectplan en een herijking van de voor de implementatie benodigde middelen, mede als gevolg van het uitstel van de wet tot 1 januari 2022. Zie ook 'wijziging planning onderwerpen LTA'.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plaatselijk Belang Barneveld heeft begin dit jaar plannen gepresenteerd voor een vergroening van het centrum. In goed overleg met de middenstandsvereniging, individuele winkeliers, een aantal hoveniers en de gemeente is een start gemaakt in de vorm van het aanleggen van geveltuintjes in de belangrijkste winkelstraten.

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Centrumgebied Voorthuizen



Voor zomervakantie is het proces om te komen tot een integrale centrumvisie voor Voorthuizen (eerste fase programmatische aanpak) gestart. De kopgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de OVV, plaatselijk belang en de wijkplatforms is voor de eerste maal bij elkaar gekomen. Daarnaast is er op een aantal data in augustus een bezoekersenquête uitgevoerd onder bezoekers van het centrum van Voorthuizen. De enquête momenten zijn zo gekozen dat een goede mix ontstaat tussen toeristen en inwoners.

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Netwerkorganisatie
Landbouwtransitie (Salentein)



Uitvoering Regiodeal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Regiodeal



327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Onderhoud wegen



332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Huisvesting onderwijs



335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Realisatie sportvoorzieningen



336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 357	- 357	-	-	- 357	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 357			- 357	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.048	- 18.186	-	-	- 18.186	
321 Veiligheid	- 5.038	- 5.060			- 5.060	
322 Groen	- 3.367	- 3.337			- 3.337	
323 Begraven	147	147			147	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.745			1.745	
325 Riolering & water	1.095	1.050			1.050	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 5.253			- 5.253	
327 Wegen	- 6.605	- 6.601			- 6.601	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878			- 878	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.804	- 16.621	-	-	- 16.621	
331 Publiekszaken	- 99	5			5	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.854			- 6.854	
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.041			- 1.041	
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.104			- 2.104	
335 Sportaccomodaties	- 4.837	- 4.873			- 4.873	
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 1.016			- 1.016	
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 739			- 739	
Totaal	- 35.209	- 35.163	-	-	- 35.163	

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	0			kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	3.260	9.903	Verkoop 1 (laatste) kavel op Puurveen, 2 kavels en grond ter uitbreiding van enkele percelen in Holzenbosch I en bouwgrond voor 13 woningen bij project Iepenhof	kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	0	166	Percelen grond in Holzenbosch I	kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	11.141	12.433	Perceel in Holzenbosch I en strookje grond t.b.v. bovenwijkse hoofdstructuur Bloemendal	kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	94	1.789	Verkoop 5 percelen snippergroen	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Rapportage faseren en doseren (32)	07-10-20	07-10-20	De 13 ^e rapportage faseren en doseren zou t/k naar de raad in oktober. Dit wordt november. Dit vanwege de werkzaamheden voor o.a. de Woonvisie, die als gevolg van corona, zijn verschoven naar het derde en vierde kwartaal.
312. Bestemmingsplan Oostbroek (602)	22-04-20	07-10-20	Was geagendeerd voor oktober. Dit wordt (indien geen zienswijzen worden ingediend) november. Planvoorbereiding heeft meer tijd gekost vanwege aanpassingen plan.
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	22-04-20	07-10-20	Was geagendeerd voor oktober. Dit wordt december*. Ontwerp-bestemmingsplan gaat binnenkort ter inzage. Vertraging doordat de civieltechnische tekening, die extern gemaakt werd, niet eerder beschikbaar was. *In de <i>agendacommissie van 7 september werd nog uitgegaan van november.</i>
321. Actualisatie nota wijkplatforms (301)	18-03-20	07-10-20	De actualisatie van deze herziene Nota wijkplatforms zou in september t/k naar de raad. Dit wordt naar verwachting maart 2021. Begin 2020 is het proces om te komen tot de verdere invulling van gebiedsregie opgestart. Helaas is door de uitbraak van het coronavirus de voortgang onderbroken. Nu de dienstverlening binnen de organisatie langzaam maar zeker weer verder uitgebreid kan worden, is het streven om dit proces in het laatste kwartaal af te ronden. Daarbij is een evaluatie van de wijkplatforms en het huidige beleid een onderdeel van dit proces. De huidige planning is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus.
323. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	07-10-20	De vergelijking van meerdere scenario's (renovatie en nieuwbouw) uitgaande van de huidige locatie, die met begrafenisondernemers zijn besproken, zou ter kennisname naar de raad in augustus, ter bespreking in de commissie van september. Dit komt in september. In dit document zal ook het voorgestelde vervolgproces worden benoemd.

323. Notitie Natuurbegraven (907)	08-07-20	08-07-20	<p>In coalitieakkoord is gemeld dat onderzocht zal worden of natuurbegraven mogelijk is in de gemeente. Deze notitie zou t/k naar de raad in juli 2020. Dit wordt 1^e kwartaal 2021. Om deze mogelijkheden te onderzoeken, is inmiddels gekeken naar het beleid van de provincie Gelderland, naar de capaciteitsplanning van de gemeente van 2016 en heeft er overleg plaats gevonden met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en St. Gelders landschap en Kastelen. Op basis hiervan blijkt het realiseren van een natuurbegraafplaats niet eenvoudig. De beleidsmatige en praktische randvoorwaarden beperken de mogelijke locaties en de terreinbeherende organisaties geven aan dat het geen kerntaak is of dat hun terreinen er niet geschikt voor zijn.</p> <p>Dit betekent dat duidelijk moet zijn in welke mate er behoefte is aan natuurbegraven binnen de gemeente Barneveld. Bij navraag bij uitvaartondernemers blijkt dat er de laatste jaren wel verzoeken zijn gedaan voor natuurbegraven. Daarvoor is gebruik gemaakt van natuurbegraafplaatsen in de omgeving.</p> <p>Voordat een notitie/voorstel wordt voorgelegd aan het college en raad is het wenselijk om een beter beeld te krijgen van de behoefte bij de Barneveldse bevolking voor natuurbegraven binnen de eigen gemeente. Hiervoor kan het burgerpanel bevestigd worden. Deze bevestiging is pas mogelijk in november 2020, waarna de notitie opgesteld kan worden.</p>
326. Notitie zonne-energie: zonneladder (900)	08-07-20	08-07-20	<p>De raad heeft op 10-07-19 ingestemd met het voorstel voor de Barneveldse Zonneladder. Daaruit blijkt dat de planologische en de tender procedure geëvalueerd wordt, naar verwachting voor de zomer van 2020. Dit memo zou t/k naar de raad in juni. Dit wordt oktober.</p> <p>In de raad van 10-7-2019 is toegezegd dat de raad wordt geïnformeerd over de 1^e bundel projecten, dat onderzocht wordt of er extra capaciteit mogelijk is voor energie-advisering bij bouwprojecten en dat er een memo naar de raad komt over de capaciteit en knelpunten van het energienet in Barneveld. Een memo over de stand van zaken omtrent initiatieven voor zonneweides is t/k naar de raad, B-3.5, 17-06-20. Memo over extra capaciteit zou t/k naar de raad in juli. Dit wordt oktober. Dan komt ook het Memo capaciteit en knelpunten energienet t/k naar de raad.</p>
326. Oprispen Strategische Visie (951)	n.v.t.	27-05-20	<p>In september zouden de notities 'terugblik Strategische Visie' en 'opgaven voor de Omgevingsvisie' ter kennisname naar de raad komen. Dit wordt één notitie die eind 2020/begin 2021 t/k naar de raad gaat. We willen deze notitie met de gemeenteraad bespreken in het kader van het procesontwerp voor het maken van de Omgevingsvisie. Dit proces willen we ook samen met de raad uitlijnen in de vorm van een herziene Startnotitie Omgevingsvisie, waarin de kaders en de aanpak voor het maken van de Omgevingsvisie worden vastgelegd. Het voorstel voor de herziene startnotitie kan geagendeerd worden voor het 1^e kwartaal 2021 (zie 326/718).</p>

326. Functieveranderingsbeleid (719)	18-03-20	08-07-20	De Jaarlijkse voortgangsrapportage komt in 2020 later dan oorspronkelijk gepland (juni) naar de raad, namelijk in het 4e kwartaal. Het functieveranderingsbeleid is regionaal beleid. De voortgangsrapportage bevat naast monitoringgegevens ook een evaluatie van het beleid. Reden hiervoor is dat binnen het programma VAB van de regio's Amersfoort en Foodvalley momenteel de mogelijkheden bezien worden tot uitbreiding van het werkingsgebied van het functieveranderingsbeleid. Door de Coronacrisis heeft de noodzakelijke afstemming hierover tussen gemeenten vertraging opgelopen.
326. Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (23)	07-10-20	07-10-20	Voorstel Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken is op 25-04-18 geamendeerd vastgesteld. Twee jaar na de oprichting wordt de OMVV geëvalueerd. Samen met de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst en -agenda, wordt de onderneming dan in volle omvang onderzocht op nut en noodzaak voor continuering en de gekozen of andere vorm. De evaluatie van de OMVV, die in 2020 was gepland (zou in oktober 2020 voor wensen en bedenkingen), wordt regionaal opgepakt naar verwachting eind 2020, begin 2021, mede gelet op de omstandigheid dat de OMVV feitelijk nog maar kort actief is. In deze periode zal ook regionaal discussie worden gevoerd over de financiering van de OMVV en wat de bijdrage van de gemeenten daarin kan zijn. Deze evaluatie komt naar verwachting in de 1e helft van 2021 voor wensen en bedenkingen naar de raad (was september 2020). Datzelfde geldt ook voor de uitwerking van de onder 9.2 van de Samenwerkingsovereenkomst genoemde onderwerpen (de Samenwerkingsagenda) (was november 2020).
327. Nota openbare verlichting (61)	22-04-20	07-10-20	Het beleidsplan openbare verlichting was geagendeerd voor oktober 2020. Dit wordt 1 ^e kwartaal 2021. In mei 2020 is de Uitgangspuntennotitie 'Licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026' door het college vastgesteld. Het uitwerken en vormgeven van deze uitgangspunten en de visie op de openbare verlichting middels een beeldend beleid vraagt meer afstemming en voorbereiding dan verwacht.
334. Toekomstbestendig Pluimveemuseum. (914).	18-03-20	07-10-20	Was voorlopig geagendeerd voor oktober. Wordt november. Het ondernemingsplan is in een afrondende fase.

335. Woningtarief OZB voor (buiten)sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang (68)	18-03-20	08-07-20	<p>In de commissie Bestuur van 24 september 2019, is, bij de bespreking van de reactie van het college om de uitvoering van de bij de Programmabegroting aangenomen motie (nr. 18), om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief voor de OZB te berekenen, aan te houden, toegezegd dat, met inachtneming van de intentie achter de motie, geïventariseerd zal worden welke subsidierelaties er zijn en geïventariseerd zal worden wat er mogelijk is.</p> <p>Dit zou bij de notitie over de tarievenstructuur betrokken worden, maar deze is een jaar uitgesteld. Eerst wordt de huidige situatie in beeld gebracht en worden mogelijke scenario's met (financiële en juridische) consequenties geschetst, waarna besluitvorming plaats kan vinden. Deze notitie zou in juni t/k naar de raad. De vraag blijkt juridisch-inhoudelijk echter dusdanig complex, dat er meer tijd nodig is dan verwacht om tot een voorstel aan het college van B&W te komen. Het t/k aan de raad aanbieden is daarom volgens de huidige inschatting niet eerder dan in het vierde kwartaal 2020 te verwachten.</p>
---	----------	----------	---

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Putterweg (869)	11-11-20	11-11-20	Inbreidingslocatie oude dorpshuis De Koepel. Bestemmingsplan was geagendeerd voor november 2020. Dit wordt december.
312. Intentieovereenkomst CV De Burgt (1027)	n.v.t.	n.v.t.	Een intentieovereenkomst over het resterende deel van de Burgt wordt op 7 oktober N.O. voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd.
322. Biodiversiteit (945)	n.v.t.	Febr. 2021	<p>Visie Biodiversiteit was geagendeerd voor februari 2021. Dit wordt juni 2021. Op 27-05-20 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor een Plan van aanpak Beleidsplan Biodiversiteit. Uit de daarin opgenomen planning blijkt dat het beleidsplan naar verwachting in juni 2021 aan de raad wordt voorgelegd.</p> <p>In het voorjaar van 2020 werd bekend dat de subsidieregeling van de provincie Gelderland, waar het opstellen van een biodiversiteitsplan onder valt, uitgeput is. Waarschijnlijk wordt deze op 1-10-20 weer opengesteld. Een subsidieaanvraag wordt voorbereid.</p>
324. Regeling bijdragen aan (afval)doelstellingen gemeente (426)	18-03-20	08-07-20	Een voorstel voor een nieuwe regeling, waar alle verenigingen aan deel kunnen nemen, om inkomsten te verwerven door bij te dragen aan het bereiken van de (afval)doelstellingen van de gemeente, was ten onrechte geagendeerd voor november. Afsproken was dat deze in december zou komen.

326. Omgevingswet/Omgevingsvisie (718)	n.v.t.	n.v.t.	<p>Voor de implementatie van de Omgevingswet worden interactieve bijeenkomsten met de raadsleden gehouden, in september en oktober. Deze monden uit in een Ambitiedocument, waarin een planning op hoofdlijnen wordt opgenomen, voor elk deelproject. Dit Ambitiedocument gaat naar verwachting ter vaststelling naar de raad in december 2020.</p> <p>Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie willen samen met de raad uitlijnen in de vorm van een herziene Startnotitie Omgevingsvisie, waarin de kaders en de aanpak voor het maken van de Omgevingsvisie worden vastgelegd. Het raadsvoorstel voor deze herziene Startnotitie kan voor het 1e kwartaal 2021 geagendeerd worden.</p>
--	--------	--------	--

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Woonvisie (422)	n.v.t.	n.v.t.	Op basis van de aangepaste planning streven we naar een vaststelling van de nieuwe woonvisie in maart 2021. Deze planning wordt op basis van de huidige inzichten als realistisch beschouwd, zie B-3.16, 08-07-20. In oktober/november 2020 zal een bijeenkomst met de raad worden belegd om de concept-woonvisie te bespreken.
321. Evenementenbeleid (662)	19-06-19	27-05-20	Het evenementenbeleid 2020-2025 is t/k naar de raad, B-3.2, 08-07-20.
325. Subsidieverordening klimaatadaptatie (838)	n.v.t.	08-07-20	De Subsidieregeling regenwater vasthouden gemeente Barneveld is vastgesteld en ter kennisname naar de raad, B-3.9, 07-10-20.
326. Locatieonderzoek Windturbines: structuurvisie wind (848)	nvt	nvt	Het MER windenergie Barneveld krijgt een aanvulling naar aanleiding van het advies van de commissie MER, die er op gericht is de besluitvorming over de structuurvisie wind en het aanwijzen van voorkeursalternatieven te versterken, zie B-3.10, 17-06-20.
326. Omgevingsvisie Barneveld Centrum (242)	n.v.t.	n.v.t.	Memo geveltuinen Barneveld centrum is t/k naar de raad, B-3.14. Daaruit blijkt welke stappen er op korte termijn gezet kunnen worden om te starten met het vergroenen van het centrum van Barneveld. Het aanleggen van geveltuinen is het meest kansrijk om op korte termijn effect te bereiken. In dit memo informeren wij de raad over hoe wij als gemeente dit initiatief ondersteunen en faciliteren.
334. Evaluatie van het Platform Cultuur en het Maatschappelijk Cultuurfonds (940)	27-05-20	27-05-20	De evaluatie van het Maatschappelijk Cultuurfonds is t/k naar de raad, B-3.11, 17-05-20.

335. Voorstel haalbaarheid accommodatie voor diverse sportaccommodaties (897)	11-12-19	08-07-20	De raad is juli geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan atletiekaccommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeelervoorziening in Barneveld. En de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek BDSV en Petanque Barneveld, B-3.5, 08-07-20. Daaruit blijkt dat een haalbaarheidsonderzoek naar één of meer varianten is doorgeschoven naar 2021, i.v.m. het financiële meerjarenperspectief.
---	----------	----------	--

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/TBp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking	
T	326	982	In de commissie grondgebied van 05-03-20 is toegezegd dat de notitie Natuurinclusief bouwen in het 2e kwartaal 2020 t/k naar de raad komt.	19-06-19	08-07-20	Plan van aanpak Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen is t/k naar de raad, B-3.3, 08-07-20. In samenhang met het toekomstige beleidsplan Biodiversiteit wordt het puntensysteem na 5 jaar geëvalueerd.
M	335	805	Onderzoek doen naar de mogelijke realisering van een 'denksportcentrum' waar de diverse denksportverenigingen in gehuisvest kunnen worden.	07-06-17	13-12-17	De raad is juli geïnformeerd over de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek BDSV en Petanque Barneveld, B-3.5, 08-07-20. En de uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan atletiekaccommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeelervoorziening in Barneveld. Daaruit blijkt dat een haalbaarheidsonderzoek naar één of meer varianten is doorgeschoven naar 2021, i.v.m. het financiële meerjarenperspectief.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 07-10-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)				
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-		681	681	-			2022
800010 - Veller I	3	2.964	-		- 3.150	- 3.150	-	3.150		2020
800011 - Veller II	3	780	0,12 ha	0,06 ha	- 1.079	- 1.079	-	1.079		2020
800024 - Holzenbosch I	3	- 200	3,55 ha	0,28 ha	3.519	2.304	- 1.215			2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.061	2,06 ha		1.634	1.635	1			2024
800033 - Puurveen	4	- 96	0,16 ha	0,16 ha	6	77	71			2020
800043 - Bloemendal	2	35.666	25,96 ha		5.876	6.154	278			2029
800045 - Verbindingsweg	2	5.033	1,72 ha		- 3.835	- 4.068	- 233	3.834		2024
800068 - Oostbroek fase 1 en 2	2	4.747	2,64 ha		867	954	87			2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	3	- 25	-		- 109	- 109	-	109		2020
800073 - Herontwikkeling Iepen Hof 29	3	- 1.217	0,42 ha	0,40 ha	819	937	118			2021
800074 - De Enk	3	- 491	-		213	235	22			2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	155	0,20 ha		1	331	330			2021

800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	241	0,18 ha	0,14 ha	32	46	14	2020
800084 - Wikselaarse Eng	3	- 919	-		199	200	1	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		48.798	37,01 ha		5.674	5.148	- 526	8.172

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:

- 800024 - Holzenbosch I: Tegenvallende aanbesteding, veel meerwerk en extra kosten speelplekken.
- 800033 - Puurveen: Project afgesloten. Resterende budgetten vervallen, hierdoor zal de winstneming in 2020 worden verwerkt van €77.000.
- 800043 - Bloemendal: Kostenraming bovenwijkse - en binnenpl. voorzieningen geactualiseerd en verlaagd, waardoor de bijdrage vanuit dit project lager is en het resultaat dus toeneemt.
- 800045 - Verbindingsweg: Extra rentelasten (ivm 1 jaar extra doorloop door stikstofproblematiek en Corona) en extra saneringskosten.
- 800068 - Oostbroek fase 1 en 2: Extra bijdrage GVVP ten behoeve van aanleg van paden, waardoor minder kosten in deze planontwikkeling.
- 800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29: Aanbestedingsvoordeel en hogere verkoopopbrengst.
- 800076 - Herontwikkeling Putterweg 1: Programma geoptimaliseerd, gronden als concessie verkocht en doorlooptijd verkort met 1 jaar.

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 - Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 - Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 - Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 - Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt normaliter in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De start met zaakgericht werken (nu: klantgericht werken) is een half jaar uitgesteld i.v.m. het organiseren van de randvoorwaarden. Het plan van aanpak is gereed en vastgesteld. De dienstverleningsprocessen rondom trouwen & partnerschap zijn verbeterd en gedigitaliseerd. Deze verbeterde e-dienst gaat in september live.

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Participatie in een netwerksamenleving



412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Rechtmatigheid



422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Digitaal werken 2020-2022



Het Plannings- en statusoverzicht Beleidsplan Digitaal werken 2019-2022 is t/k naar de raad, B-4.9, 08-07-20 en geagendeerd voor de commissie Bestuur van september.

Public Affairs

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Public Affairs



Organisatieontwikkeling

Omschrijving

Inhoud

Financiën

Planning

Risico's

Toelichting

Organisatieontwikkeling



Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
4.1 Bestuur	- 2.247	- 2.283	-	-	- 2.283	
411 Raad	- 900	- 912			- 912	
412 B&W	- 898	- 923			- 923	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 448			- 448	
4.2 Interne dienstverlening	- 21.031	- 22.289	- 220	-	- 22.509	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 1.135			- 1.135	
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 21.155	- 220		- 21.375	Werving & Selectie (€ 85.000) Inhuur (€ 135.000)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	106.048	106.261	-	-	106.261	
431 Treasury	5.079	5.079			5.079	
432 Belastingen	16.980	16.900			16.900	
433 Algemene uitkering	83.000	83.000			83.000	
434 Overige baten en lasten	- 253	38			38	
436 Werken voor derden	1.242	1.244			1.244	

Totaal	82.770	81.689	- 220	81.469
--------	--------	--------	-------	--------

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 302	1.401	1.042	491
Incidentele begrotingsruimte	- 313	237	295	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 615	1.638	1.337	841
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 284	-	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 899	1.638	1.337	841

Overzicht financiële mutaties

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)	+ 900	+ 424	+ 611	Bevolkingsgroei tot en met augustus 2020	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Strategische Agenda 2020-2025 regio FoodValley (74)	n.v.t.	n.v.t.	De raad heeft op 11-12-19 besloten geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept strategische agenda 2020-2025 ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley. Over de inhoud van de Strategische Agenda zou geen raadsvoorstel meer komen. Door nu de Strategische Agenda toch ter vaststelling aan de raden aan te bieden, wordt de raden de mogelijkheid geboden om de governance, waarvoor een separaat voorstel wordt aangeboden, gelijktijdig te behandelen met de inhoudelijke ambities.
413. Voorstel resultaatbestemming Jaarstukken VGGM (72)	26-05-20	26-05-20	De Jaarrekening 2019 is t/k naar de raad gegaan (A3, 27-05-20). Daaruit blijkt dat het voorstel resultaatbestemming onderdeel is van de gewijzigde begroting 2020, die later dit jaar ter consultatie aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Dit was geagendeerd voor oktober 2020. Dit wordt november/december. Nadat begin oktober de halfjaarrapportage door het AB is vastgesteld.
422. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (186)	27-05-20	07-10-20	Was geagendeerd voor oktober/november. De Nota wordt eerst besproken in de auditcommissie van 17 september en gaat daarna t/k naar de raad.

422. Groei voor groei (952)	n.v.t.	08-07-20	Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt zou t/k naar de raad in juni. Dit wordt niet eerder dan oktober. De financiële notitie groei-voor-groei is in voorbereiding en vordert gestaag. Doordat in de Programmabegroting 2020 reeds een basis is gelegd voor het toepassen van een methode voor een verdeling van het groeiende budget als gevolg van de groei van de gemeente, is in de coronatijd gekozen om andere zaken in het financiële domein voorrang te geven (zoals de coronamonitor; voorbereidingen op de Programmabegroting 2021; etc).
431 Coöperatie Voorthuizen Duurzaam (949)	n.v.t.	08-07-20	Bij de behandeling van het voorstel in juli 2019 voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale opwekking van energie door Coöperatie Voorthuizen duurzaam mogelijk wordt, is toegezegd dat initiatieven per tranche worden gecommuniceerd naar de raad. De verwachting was dat de Energiecoöperatie de eerste helft van 2020 met een eerste plan komt. De raad zou hierover voor de zomer geïnformeerd worden. Dit wordt naar verwachting december. Het plan is nog niet ontvangen.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. UP2020 (413)	nvt	nvt	Aan het begin van elk jaar stelt het college een uitvoeringsprogramma voor de OddV vast. Omdat het concept uitvoeringsprogramma voor 2020 (UP2020) een stijging van de kosten laat zien van € 575.000, die niet is geraamd, is het UP2020 nog niet vastgesteld. Ter afronding van de eerste helft van 2020 is het UP2020 voor de eerste helft van 2020 vastgesteld, B-3.8, 08-07-20.
422. Beleidsplan Digitaal Werken (780)	27-05-20	27-05-20	Het Plannings- en statusoverzicht Beleidsplan Digitaal werken 2019-2022 is t/k naar de raad, B-4.9, 08-07-20.

422. Optimaal gebruik maandrapportage (874)	08-07-20	08-07-20	<p>Afgesproken is de notitie 'Optimaal gebruik maandrapportage', die op 8 februari 2018 in de auditcommissie besproken is, medio 2020 te evalueren.</p> <p>Overigens is de maandrapportage o.a. in maart 2020 nog besproken in de auditcommissie. Afgesproken is deze aan te passen (o.a. invoegen totaaloverzicht kruisjes en vinkjes, info uit maandrapportage als bijlage toevoegen). Dit wordt nog verder uitgewerkt.</p> <p>Een evaluatie over de notitie (tijdigheid voorstellen en voorstellen separaat via rubriek B) is op 30 juni in de auditcommissie aan de orde geweest.</p>
---	----------	----------	---

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/TBp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	422 983	<ul style="list-style-type: none"> • Een regeling uit te werken waarbij vanaf 2020 sprake is van een (externe) adviescommissie conform 7:13 Awb, waarbij: <ul style="list-style-type: none"> - de voorzitter in ieder geval onafhankelijk is; - de adviescommissie een schriftelijk advies uitbrengt aan het college - de bezwaarmaker de keuze heeft om gehoord te worden door de adviescommissie dan wel via een ambtelijk gesprek; • Criteria op te stellen, wanneer hiervan kan worden afgeweken. • In het najaar van 2019 bij de Raad terug te komen met een uitgewerkt plan inclusief budgettering. 	09-10-19	18-03-20	Zie B-4.5, 07-10-20 'Nieuwe werkwijze afhandelen van bezwaarschriften'. Daaruit blijkt dat de uitvoering van de motie breder is getrokken en de nieuwe werkwijze, die op 1 oktober ingaat, na een jaar wordt geëvalueerd.

M	433	994	Motie verhoging en/of verlaging accres gemeentefonds: er bij de minister op aan te dringen de bijdrage aan het gemeentefonds in overeenstemming te brengen met een meer voorspelbaarder accres en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan en het trap-op-trap-af systeem zodanig aan te passen dat er minder grote en minder frequente schommelingen zijn in de Algemene Uitkering via het Gemeentefonds.	13-11-19	05-02-20	Op 28 mei 2020 heeft de M50, vanuit de M50-pijlers Bestuur en Financiën, een brief gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties over de herijking van het gemeentefonds. In die brief zijn de uitdagingen beschreven die middelgrote gemeenten voorzien bij de herijking van het gemeentefonds. Inmiddels hebben de M50 een schriftelijke reactie ontvangen van het ministerie. De "eigen" brief van de gemeente Barneveld is – net als die van veel andere gemeenten – verzonden naar het ministerie en toegevoegd aan de bundel van de VNG die op 02-07-20 is aangeboden aan de minister.
---	-----	-----	--	----------	----------	---

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 07-10-20](#)
