

MAANDRAPPORTAGE FEBRUARI 2020

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W 17 maart 2020
Verzonden aan raad 20 maart 2020
In commissie 7 april 2020
In raadsvergadering 22 april 2020

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren			X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen*		X	X	X

***De coronacrisis kan gevolgen hebben voor de planning. Deze zijn nog niet verwerkt.**

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2020

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitatie worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave inburgering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Passende maatschappelijke ondersteuning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Door de landelijk opgelegde verlaging van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen zijn er tientallen inwoners meer dan gebruikelijk WMO-huishoudelijke hulp gaan gebruiken.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Een lokaal sport- en beweegakkoord is in de maak en wordt naar verwachting in juni ondertekend. Dit is tot stand gekomen door en voor inwoners en lokale maatschappelijke organisaties. Het lokale sport- en beweegakkoord is voortgekomen uit het landelijke sportakkoord en kent vier thema's: sporten en bewegen voor kwetsbare doelgroepen, de jeugd vaardig in bewegen, vitale sportaanbieders en sporten en bewegen in de openbare ruimte.

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Transformatie Specialistische
Jeugdhulp
**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.715	- 8.715	-	-	- 8.715	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.570	- 2.570			- 2.570	
112 Reïntegratie	- 1.411	- 1.411			- 1.411	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.735	- 4.735			- 4.735	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 6.441	- 6.441	-	-	- 6.441	
121 Sportstimulering	- 270	- 270			- 270	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.534	- 1.534			- 1.534	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.637	- 4.637			- 4.637	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 34.178	- 34.178	-	-	- 34.178	
131 Inkomensvoorziening	- 2.428	- 2.428			- 2.428	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 31.750	- 31.750			- 31.750	
Totaal	- 49.334	- 49.334	-	-	- 49.334	

Indicatoren



Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	37		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	50		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	4		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	nvt	916		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	59		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	35		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.150	nvt	1.535		maand
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	566	nvt	544	Waarvan 63 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	145		maand
	132	Gesprekken woonurgenties	nvt	nvt	15		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	40		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	0		maand
	132	Unieke ontvangers (vangnet)voorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.300	nvt	2.338	**	maand

*afgerond (hele getallen)

** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal

(week 1 van 2020 start op 30-12-2019)

Verloop uitkeringsgerechtigden:

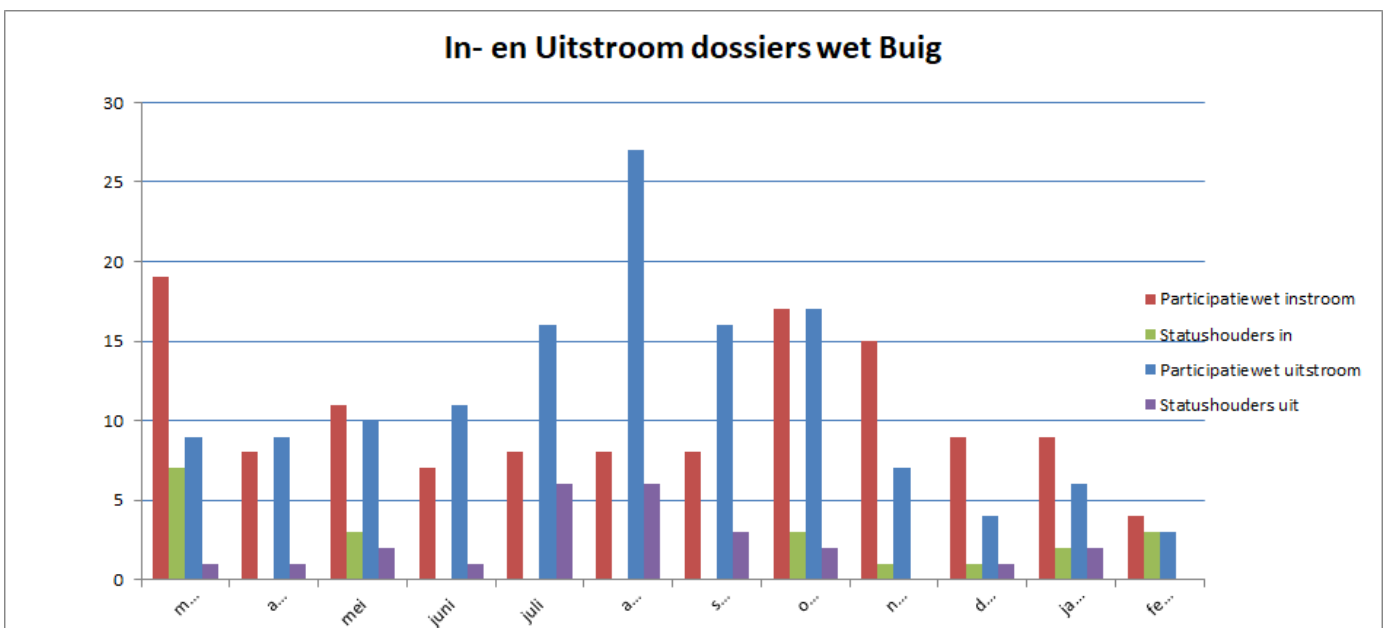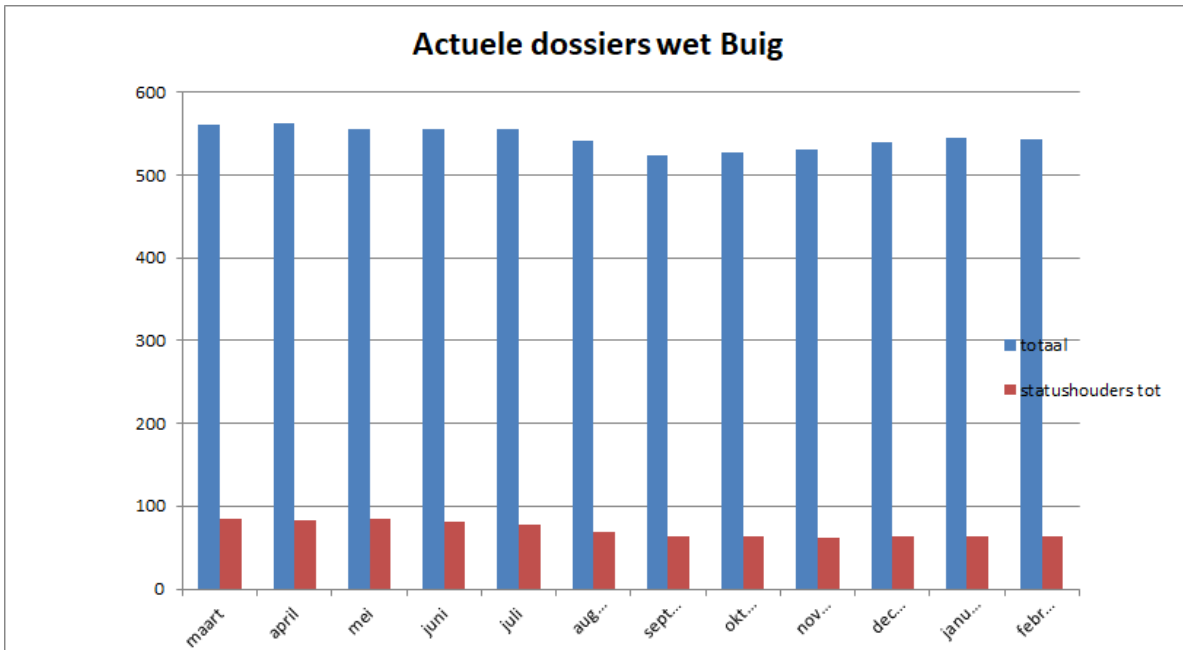

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	131	942	Toegezegd is (bij de behandeling van de motie Voedselbank) (in aanloop naar de avond over armoedebeleid) een memo over armoede in gezinnen op te zullen stellen.	02-04-19	01-09-19	Het memo over armoede in gezinnen, dat is toegezegd bij de behandeling van de motie Voedselbank (in aanloop naar de avond over armoedebeleid), is t/k naar de raad, B-1.5, 11-12-19.
T	113	969	Aanrijtijden ambulances	07-05-19	05-02-20	De prestatiecijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 zijn inmiddels eveneens door Ambulancezorg Gelderland-Midden aangeleverd, A-7, 18-03-20.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-20](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)



Dorpspromotiebeleid was geagendeerd voor maart. Dit wordt naar verwachting mei, zie 'wijziging planning onderwerpen'.

Innovatiebevordering

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering



Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden onder de windenergie-bedrijven in de gemeente Barneveld. Daarbij is positief gereageerd om tot een verdere samenwerking te komen. Te denken valt aan gemeenschappelijke opleidingen en promotie.

Recreatie en toerisme

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medio februari is € 12,5 mio toegekend aan de regiodeal Veluwe. Tevens bevindt de afronding van de nieuwe gemeentelijke toeristische visie zich in de afrondende fase. Een concept-versie is besproken met het toeristisch platform. Tenslotte is er reeds vooruitlopend op de uitvoering van de nieuwe toeristische visie een subsidie toegekend aan de stichting paardenvrienden midden nederland voor onderhoud van de ruiterroutes rond Kootwijk.
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	In theorie is het nog steeds mogelijk dat het ontwerpbestemmingsplan in december 2020 aan de raad wordt aangeboden. De planning voor Harselaar Zuid is echter uiterst onzeker. Er is nog steeds geen duidelijkheid over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek voor met name bedrijventerreinen. Onderdeel van de discussie is of beweiding en bemesting in de huidige situatie als interne saldering ingezet kan worden en in welke mate externe saldering toegepast kan worden. Zolang hier geen duidelijkheid over is zal de bestemmingsplanprocedure geen doorgang kunnen vinden.

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Mobiliteitsbeleid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>De Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Oostelijke Rondweg is door de gemeenteraden van Barneveld en Ede in december 2019 vastgesteld. Nu dit plan van aanpak voor de op te stellen Milieueffectrapportage is vastgesteld, is Arcadis gestart met het milieuonderzoek dat ongeveer één jaar in beslag neemt. De 1e helft van 2020 staat onder andere in het teken van het aanvullend verkeersonderzoek naar de noodzaak van de rondweg, het onderzoeken van het nulplusalternatief, het opstellen van de (landschaps)ontwerpen voor de tracés en de spoorkruisingsvarianten.</p> <p>Voor de A1-A30 heeft het Ministerie 18 oplossingsrichtingen onderzocht. Hieruit heeft een trechtering plaatsgevonden naar een aantal kansrijke oplossingsrichtingen die de komende maanden verder worden onderzocht op onder andere inpassing, effecten en kosten. De planning is er op gericht dat de Minister in het Bestuurlijk Overleg MIRT van november een voorkeursbeslissing neemt.</p>

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 1.445	- 1.445	-	-	- 1.445	
211 Promotie economie	- 1.445	- 1.445			- 1.445	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 102	- 102	-	-	- 102	
221 Economisch structuurbeleid	- 102	- 102			- 102	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.603	- 2.603	-	-	- 2.603	
231 Verkeer	- 3.052	- 3.052			- 3.052	
232 Parkeren	449	449			449	
Totaal	- 4.149	- 4.149	-	-	- 4.149	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,3% (dec)	1,4%	<i>Totaal aantal WW'ers in januari 2020: 435 = 1,4% Landelijk 2,6, Foodvalley 2,0%</i>	maand
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	0	0		kwartaal
222	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	n.v.t.	1.663	1 perceel grond t.b.v. traforuimte, 1 perceel Briellaerd-Noord, 2 percelen Harselaar-Zuid fase 1A en 6 percelen Achterveldseweg	kwartaal
222	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	0	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Dorpspromotiebeleid (766)	18-03-20	18-03-20	Was geagendeerd voor maart. Dit wordt naar verwachting mei. Op dit moment wordt er geïnventariseerd welke behoefte en ideeën er in de verschillende dorpen zijn ten aanzien van dorpspromotie. De uitkomsten van deze inventarisatie worden betrokken bij het opstellen van het beleid. De inventarisatieronde vergt iets meer tijd dan verwacht.

211 Kadernotitie innovatieve foodsector (901)	05-02-20	05-02-20	<p>In overleg met de sector zou een (Barneveldse) kadernotitie opgesteld worden, die in februari t/k naar de raad zou gaan. Er komt echter geen separate Barneveldse kadernotitie, maar een regionale uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda (inclusief financiën en governance) zal in het tweede kwartaal ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.</p> <p>Food en innovatie zijn belangrijke thema's van de Strategische Agenda (SA) van de regio Food Valley. Met de Regio Deal Foodvalley wordt de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem in de Regio Foodvalley versneld, waardoor een grote impuls wordt gegeven aan de werkgelegenheid, leefbaarheid in de regio en een bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van het wereldwijde voedselvraagstuk. De SA en regiodeal vormen de basis voor innovatieprojecten en -programma's in Barneveld gericht op het stimuleren van innovatie in de landbouw/foodsector.</p>
211 Breedband Buitengebied (404)	05-02-20	05-02-20	<p>Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten komt een memo naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met het budget dat nog resteert. Dit memo zou t/k naar de raad in januari 2020. Dit wordt maart.* Op dit moment zijn 2 van de 3 gebieden afgerond. <i>*Inmiddels blijkt dat dit een voorstel wordt, in het 2e kwartaal.</i></p>
221. PDV/GDV-beleid Regio Foodvalley (754)	18-03-20	18-03-20	<p>De gemeenteraden zouden, naar verwachting in maart, over de resultaten van de evaluatie van het PDV/GDV beleid in de regio worden geïnformeerd. Het PDV/GDV beleid komt in maart voor vaststelling in het portefeuillehoudersoverleg aan de orde. Waarna het voor wensen en bedenkingen naar de verschillende gemeenteraden gaat. Naar verwachting te agenderen voor mei 2020.</p>
231. Snelfietsroute Holzenbosch-Blankensgoed + maatregelen ontlasting Noord-Zuid verbinding (Voorthuizen) (599)	10-07-19	18-03-20	<p>Was voorlopig geagendeerd voor maart 2020. Wordt november 2020. Voordat diverse scenario's aan de raad voorgelegd worden, vindt het burgerparticipatie traject plaats, zodat ook de reacties en afwegingen van de omgeving meegewogen kunnen worden in de besluitvorming.</p>
231. Afwegingskader particuliere wegen (727)	18-03-20	18-03-20	<p>In 2019 is het ontwerp van de wegenlegger door het college vastgesteld en vervolgens door de provincie vastgesteld. Bij het opstellen van de wegenlegger zijn alleen de openbare (particuliere) wegen meegenomen die formeel zijn vastgesteld (fase I).</p> <p>In fase II moet inzicht komen in de omvang, het gebruik en de toestand van de particuliere wegen en de noodzaak om al deze wegen al dan niet openbaar te maken/houden. Er wordt een afwegingskader opgesteld om af te wegen wanneer een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke procedures en kosten hieraan zijn verbonden.</p> <p>De raad wordt naar verwachting in juni (was maart) 2020 geïnformeerd over het afwegingskader. De voorbereiding kost meer tijd dan voorzien. Het blijkt complexe materie waarvoor ook externe expertise wordt ingehuurd. Besluitvorming door de raad (over de financiële consequenties) vindt naderhand plaats.</p>

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
222. Bedrijventerrein Stroe (840)	22-04-20	22-04-20	Was geagendeerd voor april 2020. Dit wordt juli vanwege vertraging in de benodigde verwerving.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
31. Verkeersveiligheidsmonitor (267)	11-12-19	11-12-19	Afgedaan, zie B-2.23, 05-02-20.
31 GVVP maatregelenpakket 2020 (14)	18-03-20	13-11-19	Het GVVP-Maatregelenpakket 2020 is t/k naar de raad, B-2.19, 05-02-20. Geagendeerd voor cie in maart.
31. Verbetering fietsveiligheid burgemeester Kuntzelaan (609)	05-02-20	05-02-20	Drie maanden na uitvoering van de aanvullende maatregelen aan de inrichting van de oversteek Kuntzelaan - in het najaar 2019 -, zou evaluatie plaatsvinden. De raad zou hier in januari 2020 over geïnformeerd worden. In november 2019 is de raad reeds geïnformeerd over uitgevoerde maatregelen (o.a. drempels) en nog uit te voeren maatregelen (o.a. verlengde haag en verleggen fietspad). In november 2019 is een motie aangenomen, waarbij de geplande aanpassing van het fietspad/trottoir 'on hold' is gezet, in afwachting van de evaluatie van de gehele Burgemeester Kuntzelaan. Deze evaluatie is t/k naar de raad, B-2.4, 18-03-20.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	231	989	Evaluatie Burgemeester Kuntzelaan • met voortvarendheid de evaluatie van de gehele Kuntzelaan uit te voeren en de raad uiterlijk in januari 2020 te informeren over de uitkomsten hiervan; • in afwachting van deze evaluatie de geplande maatregel, zijnde de aanpassing van fietspad/trottoir 'on hold' te zetten	13-11-19	05-02-20	Zie Evaluatie Burgemeester Kuntzelaan, B-2.4, 18-03-20

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
Bedrijventerrein										
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	7.200	4,26 ha		- 314	- 314	-	314		2023
800008 - Briellaerd Noord	3	1.213	-	0,04 ha	- 883	- 883	-	883		2020
800020 - Harselaar Centraal	3	14.746	0,22 ha		- 14.632	- 14.632	-	14.632		2020
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 458	2,60 ha	0,03 ha	3.686	3.686	-			2021
800031 - Harselaar West West	3	- 400	-		3	3	-			2020
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.255	0,83 ha		- 859	- 859	-	859		2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.921	0,77 ha		- 717	- 717	-	717		2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	5.450	8,80 ha		6.904	6.904	-			2029
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		30.928	17,48 ha		- 6.812	- 6.812	-	17.405	-	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 17 juni 2020.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 2021-2025



312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het woonrijpmaken van het noordelijke deel van de wijk is vrijwel afgerond. In de zuidelijke clusters wordt het woonrijpmaken fasegewijs uitgevoerd. Er resteren nog ca. 60 woningen van één ontwikkelende partij, die nog moeten worden gebouwd. Hiervan zullen 40 woningen in het derde kwartaal in aanbouw worden genomen.</p> <p>In de voorzieningenstrook langs de Baron van Nagellstraat zal in het derde kwartaal worden gestart met de bouw van het woonzorgcomplex van de Woningstichting en Neboplus.</p> <p>De doortrekking van de hoofdontsluitingsweg vanuit Holzenbosch naar Wikselaarse Eng en Kromme Akker Zuid is in uitvoering. Eind tweede kwartaal zal dit zijn gerealiseerd.</p>

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Het inspraakplan voor de wijk Oostbroek (ca. 106 woningen) heeft ter inzage gelegen. Er zijn 40 inspraakreacties ingediend, waarvan ruim de helft betrekking heeft op de toekomstige verkeersontsluiting van de wijk. Momenteel worden de inspraakreacties beoordeeld. De vervolgstap is het opstellen en ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is geagendeerd voor mei. Dat wordt op zijn vroegst juli.</p>

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Met het actieplan woninginbraak is aan de slag gegaan.

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Overlast in wijken en buurten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Horeca en uitgaan in Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Horeca en uitgaan in Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De pilot verruiming terrastijden is gestart.

Digitale criminaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale criminaliteit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Uitbreiding begraafplaats De Plantage



De zetting van de opgebrachte grond (de grote hoeveelheid zand) verloopt voorspoedig. De gronden zijn inmiddels ca. 5cm ingeklonken en naar verwachting zal de volledige zetting (7cm) in juni voltooid zijn.

In de komende maanden wordt het waterleidingnetwerk gerealiseerd met de daarbij behorende grondwaterpomp. Naast deze werkzaamheden wordt het talud langs de centrale as voorzien van een versteviging en anti-erosie voorziening. Aansluitend hierop wordt het bovenvlak en de onbeplante taluds rondom de uitbreiding van de begraafplaats ingezaaid met verschillend grasmengsel.

De aankomende periode staat in het teken van het opstellen van de contractstukken voor het 'gebruiksrijp maken' van de uitbreiding. Dit bestaat onder andere uit het maken van bestektekeningen, het contract en een begroting. Zodra deze stukken gereed zijn wordt de aanbestedingsprocedure opgestart.

Naar verwachting kan begin september 2020 worden begonnen met de werkzaamheden voor het gebruiksrijp maken. Deze werkzaamheden omvatten o.a. de aanleg van de wateras, het asfalteren van hoofdpaden, het aanbrengen van de zitelementen, de beplanting, etc.

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Afvalbeleid



Voorstel Strategieplan grondstoffen 2020-2024 wad geagendeerd voor april 2020. Er treedt enige vertraging op als gevolg van de Coronacrisis. Vooralsnog uitgaan van mei.

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte



Het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie (PvA) is besproken in de commissie Samenleving (27-11-2019). In het plan van aanpak staan 19 actiepunten die in 2019 en 2020 organisatiebreed worden opgepakt met als doel in 2020 in onze activiteiten klimaatadaptief te handelen. De werkgroep Klimaatadaptatie is gestart met het voorbereiden en uitvoeren van de acties.

Binnen de organisatie van het Platform Water Vallei & Eem wordt samen met de Regio's Noord en Oost Veluwe gewerkt aan het verder bouwen aan het gezamenlijk klimaatdossier (DPRA). Om te stimuleren dat binnen de samenwerking alle gemeenten en het Waterschap in 2020 klimaatbewust handelen is een voorstel gemaakt vanuit de weten-willen-werken systematiek. In dit voorstel zijn activiteiten opgenomen die het Platform aanbiedt en waar we - ook vanuit Barneveld- gebruik van kunnen maken, zoals deelname aan masterclasses of intervisiegroep Ruimtelijke Adaptatie, gerichte excursies in regio, delen kennis, voeren van risicodialogen, gebruik maken van format opstellen uitvoeringsprogramma. Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan een Regionaal Adaptatie Plan (RAP). De Barneveldse interne werkgroep heeft de belangrijkste thema's op lokaal en regionaal niveau aangegeven.

Tijdens de inloopavond Bloemendal is een flyer verspreid over klimaatadaptatie in Bloemendal. Ook geeft de flyer in algemene zin aan hoe particuliere tuinen klimaat adaptiever ingericht kunnen worden. De flyer vormt de basis voor aanvullend communicatiemateriaal. Er is contact gelegd met de plaatselijke afdeling van Groei en Bloei en enkele hoveniers om de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van klimaatadaptatie te bekijken. Klimaatadaptatie is als thema meegenomen in de Dorpentoer Stroe. Er is een presentatie over het thema gegeven en er was de mogelijkheid tot een groeps gesprek.

Waterbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid



326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Energievisie



Regionale Energie Strategie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Regionale Energie Strategie



Warmtevisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Warmtevisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het raadsvoorstel 'proces op weg naar de structuurvisie windenergie' is op 05-02-20 geamendeerd vastgesteld (Zeumeren niet in structuurvisie). De raad heeft op 5 februari 2020 besloten tot het organiseren van een winddialoog voor vijf gebieden in de gemeente Barneveld. De keuze van deze gebieden is gebaseerd op de uitkomsten van het MER dat 22 januari 2020 is verschenen. De memo winddialoog beschrijft de vervolgstappen in de ontwikkeling van de dialoog, B-3.20, 18-03-20.

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het concept plan van aanpak Biodiversiteit is besproken met betrokkenen en wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het plan van aanpak natuurinclusief bouwen komt in het 2e kwartaal ter kennisname naar de raad.

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingswet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanaf 1 april 2020 is er geen projectleider. De verwerving is gestart, maar er is nog geen geschikte kandidaat. De VNG heeft aangegeven wat er minimaal moet gebeuren voor de inwerkingtreding van de wet. Er zijn heel veel acties. Eind februari is de lijst uitgebreid, waardoor het aantal acties is toegenomen. Er is niet altijd capaciteit voor het oppakken van de acties. Dit is een risico voor de invoering van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Omgevingsvisie Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Barneveld

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Barneveld	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Centrumgebied Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumgebied Voorthuizen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het college heeft inmiddels besloten om extra middelen vrij te maken om de benodigde ambtelijke capaciteit voor het opstellen van het programma zeker te stellen. Er wordt op dit moment een plan van aanpak opgesteld voor de wijze waarop de eerste fase van het programma (opstellen centrumvisie) kan worden vorm gegeven. Dit onderdeel willen wij in co-creatie via drie pijlers (verkeer, economie en ruimtelijke kwaliteit/groen) vorm gaan geven. Vanwege de uitbraak van het corona-virus is het op dit moment lastig om een exacte planning te geven waarop de planvorming van start kan gaan.

Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Uitvoering Regiodeal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Regiodeal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Realisatie sportvoorzieningen

**336 Overige accommodaties****Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen**

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen**Financiën**

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 357	- 357	-	-	- 357	
311 Volkshuisvesting	- 357	- 357			- 357	
312 Grondexploitatie woningen	-	-				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 18.048	- 18.048	- 145	-	- 18.193	
321 Veiligheid	- 5.038	- 5.038			- 5.038	
322 Groen	- 3.367	- 3.367			- 3.367	
323 Begraven	147	147			147	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.753	1.753			1.753	
325 Riolering & water	1.095	1.095			1.095	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 5.156	- 5.156			- 5.156	
327 Wegen	- 6.605	- 6.605	- 145		- 6.750	Inhuur projectleider Civiel
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 878	- 878			- 878	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.804	- 16.804	-	-	- 16.804	
331 Publiekszaken	- 99	- 99			- 99	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.963	- 6.963			- 6.963	
333 Bibliotheek	- 1.041	- 1.041			- 1.041	
334 Kunst en cultuur	- 2.111	- 2.111			- 2.111	
335 Sportaccommodaties	- 4.837	- 4.837			- 4.837	
336 Overige accommodaties	- 1.016	- 1.016			- 1.016	
337 Speelvoorzieningen	- 739	- 739			- 739	
Totaal	- 35.209	- 35.209	- 145	-	- 35.354	

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	nvt.	0		kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Intern in 2020 geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2020	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2020 geleverde m2 grond	nvt	nvt	3.776	Grond nabij Nijkerkerweg (project Bloemendal)	kwartaal
	312	Aantal in 2020 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	nvt	121	strook grond	kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
12. Woningbouwlocatie Terschuur (409)	18-03-20	18-03-20	Kaderstellend voorstel was voorlopig geagendeerd voor maart 2020. Dit wordt naar verwachting juli. De onderhandelingen duren langer dan gehoopt.
21. Actualisatie nota wijkplatforms (301)	05-02-20	18-03-20	De actualisatie van de herziene Nota wijkplatforms zou t/k naar de raad komen in maart. Dit wordt naar verwachting september 2020. Dit vanwege de nauwe samenhang met diverse opgaven waar we met elkaar voor staan o.a. gebiedsregie, burgerparticipatie en de omgevingswet. Met de wijkplatforms wordt momenteel gesproken over het toekomstbeeld en de veranderende rol van de platforms in relatie tot eerder genoemde opgaven. Daarbij is een evaluatie van de wijkplatforms en het huidige beleid een onderdeel binnen dit proces. Deze trajecten vragen om een goede voorbereiding, zowel in- als extern, met aandacht voor de agenda en benodigde tijdsinzet van de wijkplatformleden. Deze zorgvuldige voorbereiding is van belang om met elkaar te komen tot een heldere kijk op de veranderende rol van de platforms en de capaciteit die de platformleden hiervoor hebben of willen betrekken vanuit hun wijken.
22. Uitgangspuntennotitie rondjes om en 1 de kernen (896)	06-03-19	11-12-19 18-03-20	De Rapportage Verkenning Wandelroutes is t/k naar de raad, B-2.24, 05-02-20. En geagendeerd voor de commissie van maart. Hieruit blijkt dat er behoefte is voor het aanleggen van wandelrondjes om de kernen. De te realiseren wandelrondjes sluiten aan op bestaande, waardoor een wandelnetwerk ontstaat. Een dekkingsvoorstel met een aanpak hoe het wandelnetwerk te realiseren, was geagendeerd voor maart. Dit wordt het 2 ^e kwartaal van 2020 (april/mei).
22. Biodiversiteit (945)	n.v.t.	13-11-19	N.a.v. de behandeling van de motie biodiversiteit in de commissie Samenleving van 3 april was toegezegd dat er in het najaar van 2019 een startnotitie naar de raad zou gaan en in de loop van 2020 een Beleidsplan. In het 2 ^e kwartaal (naar verwachting mei) 2020 wordt een plan van aanpak ter vaststelling aan de raad aangeboden voor het opstellen van een programma Biodiversiteit waarbij de visie en implementatie van biodiversiteit binnen beleid, beheer en uitvoering wordt weergegeven.
23. Rouwcentrum Plantagelaan (939)	n.v.t.	18-03-20	De vergelijking van meerdere scenario's (renovatie en nieuwbouw) uitgaande van de huidige locatie, die met begrafenisondernemers zijn besproken, zou ter kennisname naar de raad in maart (ter bespreking in de commissie van april). Dit wordt april (commissie van mei). Bespreking met de begrafenisondernemers vindt plaats in februari, waarna meerdere scenario's mogelijk aangepast worden.

24. Afvalbeleidsplan (426)	18-03-20	18-03-20	Voorstel Strategieplan grondstoffen 2020-2024 was geagendeerd voor maart 2020. Dit wordt naar verwachting april. Besluitvorming kost meer tijd dan voorzien. * <i>Inmiddels blijkt dat dit mei wordt.</i>
26. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	11-12-19	In de maandrapportage van december is reeds gemeld dat het programma voor Voorthuizen in december 2019 t/k naar de raad zou komen. En dat het concept-programma gereed is. Maar dat er op dit moment afstemming plaats vindt over de benodigde ambtelijke capaciteit. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, zal de planning worden aangepast.
26. Ofrissen Strategische Visie (951)	n.v.t.	18-03-20	<p>In het 1^e kwartaal zouden wij een plan van aanpak presenteren, waarin wij schetsen hoe het traject om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld er uit gaat zien.</p> <p>Er is inmiddels veel informatie opgehaald. Dit wordt momenteel verwerkt in een leesbaar stuk voor de raad. We verwachten de raad in het 1e kwartaal, via een raadsinformatiebrief, te kunnen informeren over de Ofrissing van de Strategische Visie.</p> <p>Het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie volgt nadat de oprissing is afgerond. Dit wordt, naar verwachting, het 2e kwartaal 2020.</p>
26. Verblijfsrecreatie (23)	18-03-20	18-03-20 07-10-20	<p>Besluit m.b.t. Visie Verblijfsrecreatie 'Kansen en Koersen oktober 2015' is geamendeerd vastgesteld op 16-12-15.</p> <p>Hierin is onder meer een Fondsconstructie benoemd, zoals beschreven in het voorstel Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken, naar verwachting nodig om transformatie/herstructurering goed van de grond te krijgen.</p> <p>Dit voorstel is op 25-04-18 geamendeerd vastgesteld. De uitwerking van de onder 9.2 van de Samenwerkingsovereenkomst genoemde onderwerpen (de Samenwerkingsagenda) zou naar verwachting in maart 2020 voor wensen en bedenkingen aan de raad voorgelegd. Dit wordt naar verwachting, vanwege gebrek aan capaciteit, het vierde kwartaal van 2020.</p>

26. Regionale Energie Strategie (911)	18-03-20	18-03-20	<p>De concept-Regionale Energie Strategie (RES) was voorlopig geagendeerd voor maart 2020. Dit wordt mei. <i>Hiervoor komt een (extra) commissievergadering op 21 april (voorstel is op 8 april beschikbaar)</i>. Op 9 maart en 6 mei zijn er regionale raads(informatie)bijeenkomsten.</p> <p>Het voorstel voor het Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley is op 9 oktober 2019 geamendeerd vastgesteld, waarbij onder andere beslispunt e is toegevoegd: het college informeert de raad in het eerste kwartaal van 2020 middels een memo over: (1) de op dat moment bepaalde inzet in TeraWattuur (TWh) (en mogelijke scenario's) van de Regio Foodvalley; (2) wat het huidige beleid is en wat de daarbij horende ambities daarin betekenen; (3) een richting voor de bijdrage die Barneveld moet leveren en in hoeverre het huidige beleid hiervoor (on)toereikend is. Dit memo komt in maart t/k naar de raad. De concept-RES wordt vertaald naar een definitieve RES, die naar verwachting eind 2020/begin 2021 ter besluitvorming naar de raad komt.</p>
26. Circulaire economie (913)	18-03-20	18-03-20	<p>In maart zou het (Lokale) Plan van Aanpak circulaire economie t/k naar de raad komen. De startnotitie circulaire economie komt met een raadsvoorstel naar de raad, te agenderen voor maart.</p> <p>Startnotitie is basis voor Actieprogramma Circulaire economie, dat in september/oktober mogelijk ter vaststelling naar de raad komt.</p>
26 Uitvoeringsprogramma energie (582)	05-02-20	05-02-20	<p>Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en een actieplan voor het daaropvolgende jaar wordt opgesteld. Dit komt (jaarlijks) t/k naar de raad in januari. Dit wordt februari*. De evaluatie van de duurzaamheidsverordeningen is hierin opgenomen. <i>*inmiddels blijkt dat dit maart wordt.</i></p>
34. Toekomstbestendig 'luimveemuseum (914)	18-03-20	18-03-20	<p>Het museum is aan zet om met een concreet plan te komen. Besluitvorming door de raad was voorlopig geagendeerd voor maart 2020. Dit wordt voorlopig juli. Het pluimveemuseum heeft meer tijd nodig.</p>
35. Onderzoek atletiek- en skeelerbaan 397)	11-12-19	05-02-20	<p>De raad zou in februari geïnformeerd worden over de uitkomsten van een onderzoek naar behoefte aan atletiek accommodatie (eventueel gecombineerd) met een skeeler- en ijsbaan in Barneveld. Dit wordt maart.</p>
35. Accommodatie voor diverse portactiviteiten (978)	18-03-19	18-03-19	<p>De Kadernota 2020-2023 is geamendeerd vastgesteld. De raad heeft besloten het bedrag dat gereserveerd staat voor de aanleg van jeu de boulesbanen en bouldrome ad € 615.000 te labelen als 'accommodatie voor diverse sportactiviteiten' en dit bedrag pas te besteden nadat de raad daar middels het aannemen van een verder uitgewerkt raadsvoorstel mee in heeft gestemd. Dit voorstel was voorlopig geagendeerd voor maart 2020. Dit wordt medio 2020. Zoals hierboven vermeld is het logisch om in het haalbaarheidsonderzoek voor atletiek- en skeelervoorzieningen in Barneveld, ook de jeu de boulesbanen en het bouldrome te betrekken.</p>

35. Tarieven buitensportaccommodaties 38)	18-03-19	18-03-19	<p>In de Kadernota 2020 is aangekondigd dat er een notitie t/k naar de raad gaat over wijziging van de tarievenstructuur en verhoging van de inkomsten van de gemeentelijke buitensportaccommodaties.</p> <p>Daarnaast is in de commissie Bestuur van 24 september 2019, bij de bespreking van de reactie van het college om de uitvoering van de bij de Programmabegroting aangenomen motie (nr. 18), om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief voor de OZB te berekenen, aan te houden, toegezegd dat, met inachtneming van de intentie achter de motie, geïnventariseerd zal worden welke subsidierelaties er zijn en geïnventariseerd zal worden wat er mogelijk is. Dit wordt bij de notitie over de tarievenstructuur betrokken. Hierbij wordt eerst de huidige situatie in beeld gebracht en worden mogelijke scenario's met (financiële en juridische) consequenties geschetst, waarna besluitvorming plaats kan vinden.</p> <p>De tarievennota zou in maart t/k naar de raad gaan. Dit wordt juni. Het uitwerken van de intentie van de motie vergt de nodige uitwerking en afstemming.</p>
37. Evaluatie speelruimtebeleidsplan 71)	18-03-20	18-03-20	Jaarlijkse evaluatie komt begin van het jaar (maart) t/k naar de raad.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Oost fase 2 (602)	05-02-20	22-04-20	Het bestemmingsplan Oostbroek (naam gewijzigd) was geagendeerd voor april 2020. Dit wordt op zijn vroegst juli* 2020. Het inspraakplan heeft ter inzage gelegen (40 inspraakreacties). Dit vergt een zorgvuldige beoordeling voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan, dat vervolgens ter inzage gelegd wordt. <i>*in de agendacie 17/2 werd nog uitgegaan van mei.</i>
312. Bestemmingsplan Woudse Erven (837)	22-04-20	22-04-20	Was geagendeerd voor april 2020. Dit wordt naar verwachting oktober 2020. Door onderhandelingen met grondeigenaren en de stikstofproblematiek is het plan vertraagd. Inmiddels kunnen we meedelen dat er een inloopavond op 5 maart gepland staat. Dit is de start van de inspraak.
312. Bestemmingsplan Putterweg (869)	22-04-20	22-04-20	Was geagendeerd voor april 2020. Dit wordt naar verwachting november 2020, vanwege discussie over dit plan in relatie tot de dorpsvisie.
312. Bestemmingsplan Verbindingsweg (603)	22-04-20	22-04-20	Was geagendeerd voor april 2020. Dit wordt op zijn vroegst december 2020. Uit recente berekeningen blijkt dat het plan Werklandschap Verbindingsweg een aanzienlijke overschrijding van de maximaal toegestane stikstofdepositie oplevert. De komende tijd wordt onderzocht op welke wijze de stikstofdepositie terug gebracht kan worden. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe het beleid op rijks- en provinciaal niveau zich zal ontwikkelen.

326. Structuurvisie Verblifsrecreatie (23)	22-04-20	22-04-20	Was geagendeerd voor april 2020. Dit wordt naar verwachting najaar 2020, vanwege gebrek aan capaciteit.
--	----------	----------	---

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	321	970	Motie Afspraken Luilakken, waarbij het college is opgeroepen de "Luilak-jongeren" uit te nodigen voor een gesprek en tijdens dit gesprek gezamenlijk afspraken te maken over de volgende thema's: - Verkeersveiligheid tijdens Luilakken - Aanvangstijd van het Luilakken - Routes en het mogelijk vermijden van bijvoorbeeld zorgen verpleegtehuizen - De voertuigen waar gebruik van wordt gemaakt tijdens het "Luilakken"	10-07-19	14-10-19	Zie collegebesluit Stand van zaken en vervolgstappen luilakken, B-3-12, 05-02-20. Daaruit blijkt dat er na koningsdag 2020 een evaluatie wordt ingepland met alle betrokken partijen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg volgen er eventuele verdere acties (bijvoorbeeld het opnemen van een artikel in de APV etc.)
M	321	972	Motie verruiming terrastijden horeca, waarbij het college is verzocht: • zo spoedig mogelijk met KNH afd. Barneveld in gesprek te gaan over hun brief; • in samenspraak met horecaondernemers, omwonenden en andere betrokkenen in het horecaoverleg te komen tot een plan van aanpak voor een pilot van een jaar, waarin de verruiming van terrastijden van 00:00 uur naar 01:00 uur een plek krijgt; • een evaluatie van de pilot in het plan van aanpak op te nemen met daarin nadrukkelijk aandacht voor het concreet monitoren van overlast; • het plan van aanpak ter informatie naar de gemeenteraad te sturen;	10-07-19	11-12-19	Zie B-3.25, 05-02-20. Daaruit blijkt dat de burgemeester een pilot voor openstelling van het terras voor alle dagen tot 01.00 uur instelt, voor de periode van 1 mei – 30 september 2020 voor de gebieden Barneveld Centrum en in Voorthuizen Centrum. Horecaondernemers (uit pilotgebied) kunnen zich aanmelden om mee te doen met deze pilot en informeren omwonenden. Na afloop vindt een evaluatie plaats via een enquête door een extern bureau ter rapportage aan de gemeenteraad, die eind 2020 beslist of de pilot al dan niet definitief wordt en de Apv gewijzigd wordt.

M	322	947	Bestrijding eikenprocessierups: -Bij wegen en fietspaden die omzoomd zijn door eiken deze mezenkastjes en insectenhotels op te hangen; - te onderzoeken waar nog meer mogelijkheden zijn om de eikenprocessierups ook te bestrijden op deze natuurlijke manier - te onderzoeken hoe andere biologische bestrijders ingezet kunnen worden tegen de eikenprocessierups; - te onderzoeken of deze kastjes en hotels gemaakt kunnen worden door onze plaatselijke bedrijven waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, om welke reden dan ook, werken. In de raad van 13-11-2019 is toegezegd dat er eind van het jaar een PvA rondom de aanpak van de eikenprocessierups komt.	17-04-19	05-02-20	Zie Plan van aanpak Bestrijding eikenprocessierups, B-3.22, 05-02-20. Gevraagd om agendering voor commissie van maart.
T	326	982	Er komt een memo naar de raad over Natuurinclusief bouwen (n.a.v. aanpak Den Haag) (<i>motie 30 hierover is vervolgens ingetrokken</i>). In de commissie samenleving van 27-11-19 is bij de bespreking van het PvA Klimaatadaptatie opgemerkt een relatie te leggen met dit onderwerp	19-06-19	05-02-20	Zie B-3.16, 05-02-20, Besluit inzake motie natuur inclusief bouwen. Gevraagd om agendering voor commissie van maart. Hieruit blijkt dat natuurinclusief bouwen ook binnen de maatregelen in het plan van aanpak Klimaatadaptatie past, zoals tegengaan hittestress, groene schoolplein en klimaatbestendig bouwen.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-20](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2020	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	99	-	-	681	681	-	-	-	2022
800010 - Veller I	3	2.964	-	-	- 3.150	- 3.150	-	3.150	-	2020
800011 - Veller II	3	673	0,12 ha	-	- 1.079	- 1.079	-	1.079	-	2020
800024 - Holzenbosch I	3	349	3,55 ha	-	3.519	3.519	-	-	-	2022
800025 - Holzenbosch II	2	2.062	2,06 ha	-	1.634	1.634	-	-	-	2024
800033 - Puurveen	3	240	0,16 ha	-	6	6	-	-	-	2020
800043 - Bloemendal	2	35.863	25,96 ha	-	5.876	5.876	-	-	-	2029
800045 - Verbindingsweg	2	4.985	1,72 ha	-	- 3.835	- 3.835	-	3.834	-	2023

800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	2	4.789	2,64 ha		867	867	-		2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	24	-		- 109	- 109	-	109	2020
800073 - Herontwikkeling Iepen Hof 29	2	355	0,42 ha		819	819	-		2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	3	- 607	-		213	213	-		2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	147	0,20 ha		1	1	-		2022
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	3	332	0,18 ha	0,10 ha	32	32	-		2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	3	- 1.660	-		199	199	-		2020
Totaal IEGG - Woningbouw		50.616	37,01 ha		5.674	5.674	-	8.172	-

Opmerkingen:

- Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 17 juni 2020.
- De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
- De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
- De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Het dienstverleningsconcept is ter kennisname naar de raad, B.4-13, 18-03-20. Vanuit de beleving 'Ik ben blij met Barneveld' hebben we de behoeften van inwoners en ondernemers vertaald naar een belofte over onze dienstverlening. We richten ons in het dienstverleningsconcept op die dienstverlening waarbij inwoner en ondernemer in de rol van klant ons benaderen. De gemeente heeft daar een rol als dienstverlener en werkt klantgericht. Klantgericht betekent voor ons dat we in onze producten & diensten, processen en communicatie zo veel mogelijk aansluiten bij de beleving, situatie en verwachtingen van onze inwoners en ondernemers. In het dienstverleningsconcept geven we per kanaal aan welk minimaal gewenst kwaliteitsniveau wij willen gaan bieden in onze dienstverlening. We maken inzichtelijk waar de prioriteiten liggen voor 2020 en 2021 om effectieve stappen richting dat gewenste kwaliteitsniveau te zetten.

Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Participatie in een netwerksamenleving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rechtmatigheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De auditcommissie is over de stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording geïnformeerd. Het Plan van Aanpak is voor de volgende vergadering van de auditcommissie geagendeerd.

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitaal werken 2020-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Public Affairs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Public Affairs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Organisatieontwikkeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting College voorstel
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
4.1 Bestuur	- 2.247	- 2.247	-	-	- 2.247	
411 Raad	- 900	- 900			- 900	
412 B&W	- 898	- 898			- 898	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 448	- 448			- 448	
4.2 Interne dienstverlening	- 21.031	- 21.031	- 111	-	- 21.142	
421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 1.135	- 1.135			- 1.135	
422 Ondersteuning organisatie	- 19.897	- 19.897	- 111		- 20.008	Planning budgetcyclus 2020: (€ 15.000) Informatiebeveiliging (€ 60.000)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	106.048	106.048	- 80	-	105.968	Online chatten met gemeente (€36.000)
431 Treasury	5.079	5.079			5.079	
432 Belastingen	16.980	16.980	- 80		16.900	wijziging taxatiegrondslag wet WOZ
433 Algemene uitkering	83.000	83.000			83.000	
434 Overige baten en lasten	- 253	- 253			- 253	
436 Werken voor derden	1.242	1.242			1.242	
Totaal	82.770	82.770	- 191	-	82.579	

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2020	2021	2022	2023
Structurele begrotingsruimte	- 252	1.451	1.092	541
Incidentele begrotingsruimte	179	302	302	350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage	- 73	1.753	1.394	891
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	- 50	- 50	- 50	- 50
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 336	- 65	- 7	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 459	1.638	1.337	841

Overzicht financiële mutaties

Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)	+ 900	+ 968	+ 1.105	Bevolkingsgroei tot en met december 2019	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
13 Strategische agenda voor Food Valley 2019-2021 (74)	n.v.t.	18-03-20	De raad heeft op 11-12-19 besloten geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept strategische agenda 2020-2025 ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley. In de raad van 11-12-2019 is toegezegd dat er voorjaar 2020 concrete voorstellen naar de raad komen over de governance structuur. Was voorlopig geagendeerd voor maart. Wordt naar verwachting mei/juni. Dan zal de behandeling plaatsvinden van de definitieve Strategische Agenda (inclusief uitwerking financiën en governance). De Eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 is t/k naar de raad, B-4.2, 18-03-20.
22. Groei voor groei (952)	n.v.t.	05-02-20	Notitie waarin de financiële effecten van de verwachte groei van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt zou t/k naar de raad in februari. Dit wordt, door capaciteitstekort en andere prioritering, april.
22. Public Affairs (985)	n.v.t.	05-02-20	Het public affairs actieplan zou eind 2019 t/k naar de raad. Dit wordt maart 2020. Het traject van het opstellen hiervan kostte meer tijd dan voorzien.
22. Informatiebeleidsplan (780)	18-03-20	18-03-20	Het Informatiebeleidsplan, inclusief projectenkalender, zou in maart 2020 t/k naar de raad komen. Dit wordt mei. Dan komt het Beleidsplan Digitaal Werken t/k naar de raad en is ook de vervolgplanning gereed.

31 Coöperatie Voorthuizen Duurzaam 349)	n.v.t.	05-02-20	Bij de behandeling van het voorstel in juli 2019 voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale opwekking van energie door Coöperatie Voorthuizen duurzaam mogelijk wordt, is toegezegd dat initiatieven per tranche worden gecommuniceerd naar de raad. De verwachting was dat de Energiecoöperatie in het najaar met een eerste plan zou komen. <i>Dit wordt de eerste helft van 2020. De raad wordt hier over geïnformeerd.</i>
--	--------	----------	--

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
431. Schuldennotitie (282)	17-04-19	05-02-20	De actualisatie van de schuldennotitie 2019 is t/k naar de raad, B-4.1, 18-03-20. De planning is om de notitie in 2022 te actualiseren. Aan de auditcommissie is aangeboden worden om de notitie inhoudelijk te bespreken.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	421	1004	In de commissie Bestuur is toegezegd de vraag over de lantaarnpalen (die al toegerust zouden zijn met apparatuur geschikt voor 5G, zonder EU keurmerk) schriftelijk te beantwoorden.	21-01-20	17-02-20	De lantaarnpalen zijn niet 5G ready. Er zit geen 24 uren spanning op, dat nodig zou zijn voor het ondersteunen van 5G. Er zit in de masten ook geen elektronica voor 5G. Voor zo ver bekend zijn de onderdelen die gebruikt worden in de palen en armaturen afkomstig van degelijke leveranciers en voldoet het product aan de daarvoor geldende regels binnen de EU.

T	422	975	Pilot blockchain duurzaamheid: De wethouder zegt toe de raad in september 2019 te zullen informeren over de voortgang van de pilot, waaronder het go/no go moment in september.	25-06-19	09-10-19	Zie B-4.14, 05-02-20. Daaruit blijkt dat het experiment blockchain doorgaat. Maar niet het proces aanvragen en verstrekken duurzaamheidslening wordt in een blockchainoplossing gezet, maar het proces zomerzwembadabonnement voor minima. Bij afloop van het experiment wordt de business case en het implementatieplan opgeleverd, naar verwachting in maart/april 2020.
T	422	919	N.a.v. de bespreking van de Programmabegroting 2019 in de commissie Bestuur van 30 oktober is toegezegd dat de app 'Buiten Beter' ingezet zal worden (voor meldingen openbare ruimte, MOR).	30-10-18	06-03-19	In de commissie Bestuur van 29 oktober 2019 is gevraagd naar het koppelen van de BuitenBeterapp met het meldingsysteem (via de website). Voor meldingen openbare ruimte (MOR), is inmiddels, naast de mogelijkheid om meldingen via de website te melden, ook een meldapp ingezet. De app die hier voor gebruikt wordt is er een van de leverancier van ons huidige systeem. De functionaliteit van deze app 'MijnGemeente' is vergelijkbaar met de app Buiten Beter. Verschil is dat deze app gekoppeld is met ons meldingen systeem. Meldingen die via andere apps binnen komen worden wel in behandeling genomen, maar hierover wordt niet via de gebruikte app met de melder gecommuniceerd. Dat komt omdat deze apps niet zijn aangesloten op het systeem dat de gemeente gebruikt. Het is namelijk behoorlijk kostbaar een app op het meldingen systeem aan te sluiten, zodat dit niet bij iedere app die op de markt is, het geval is.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 18-03-20](#)
